


ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	01 settembre		01 ottobre	
							31/08	14/09	28/09	
1		<b>Delineazione specifiche</b>	<b>52 g</b>	<b>lun 03/10/16</b>	<b>sab 10/12/16</b>					
2		Proposta	6 g	lun 03/10/16	lun 10/10/16					
3		Piano di Progetto	9 g	mar 11/10/16	ven 21/10/16	2				
4		Analisi Specifica	8 g	lun 24/10/16	mer 02/11/16	3				
5		Piano di Testing	9 g	gio 03/11/16	mar 15/11/16	4				
6		Doc. Progettaz./prototipazione	19 g	mer 16/11/16	sab 10/12/16	5				
7		Project Management	108 g?	lun 03/10/16	lun 27/02/17					
8		Preparazione ambiente di sviluppo	10 g	lun 03/10/16	ven 14/10/16					
9		Apprendimento	7 g	sab 22/10/16	lun 31/10/16	2				
10		<b>Produzione</b>	<b>50 g</b>	<b>dom 11/12/16</b>	<b>gio 16/02/17</b>	<b>6</b>				
11		Codice App	50 g	dom 11/12/16	gio 16/02/17					
12		Codice UI	50 g	dom 11/12/16	gio 16/02/17					
13		Codice query sui dataset	50 g	dom 11/12/16	gio 16/02/17					
14		Controllo qualità	51 g?	ven 16/12/16	ven 24/02/17					
15		Collaudo	6 g?	lun 20/02/17	sab 25/02/17	10				
16		Rilascio e pubblicazione	1 g?	lun 27/02/17	lun 27/02/17	15				

Progetto: PDP\_Gantt  
Data: mer 19/10/16

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			

12/10	01 novembre 26/10	09/11	01 dicembre 23/11	07/12	21/12	01 gennaio 04/01	18/01	01 febbraio 01/02	15/02	01 marzo 29/02	14/03	01 aprile 28/03
-------	----------------------	-------	----------------------	-------	-------	---------------------	-------	----------------------	-------	-------------------	-------	--------------------



Progetto: PDP\_Gantt  
Data: mer 19/10/16


Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			

11/04 | 01 maggio | 09/05 | 23/05 | 01 giugno | 06/06 | 20/06 | 01 luglio | 04/07 | 18/07 | 01 agosto | 01/08 | 15/08 | 01 settembre | 29/08 | 12/09 | 01 ottobre | 26/09



Progetto: PDP\_Gantt  
Data: mer 19/10/16

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			

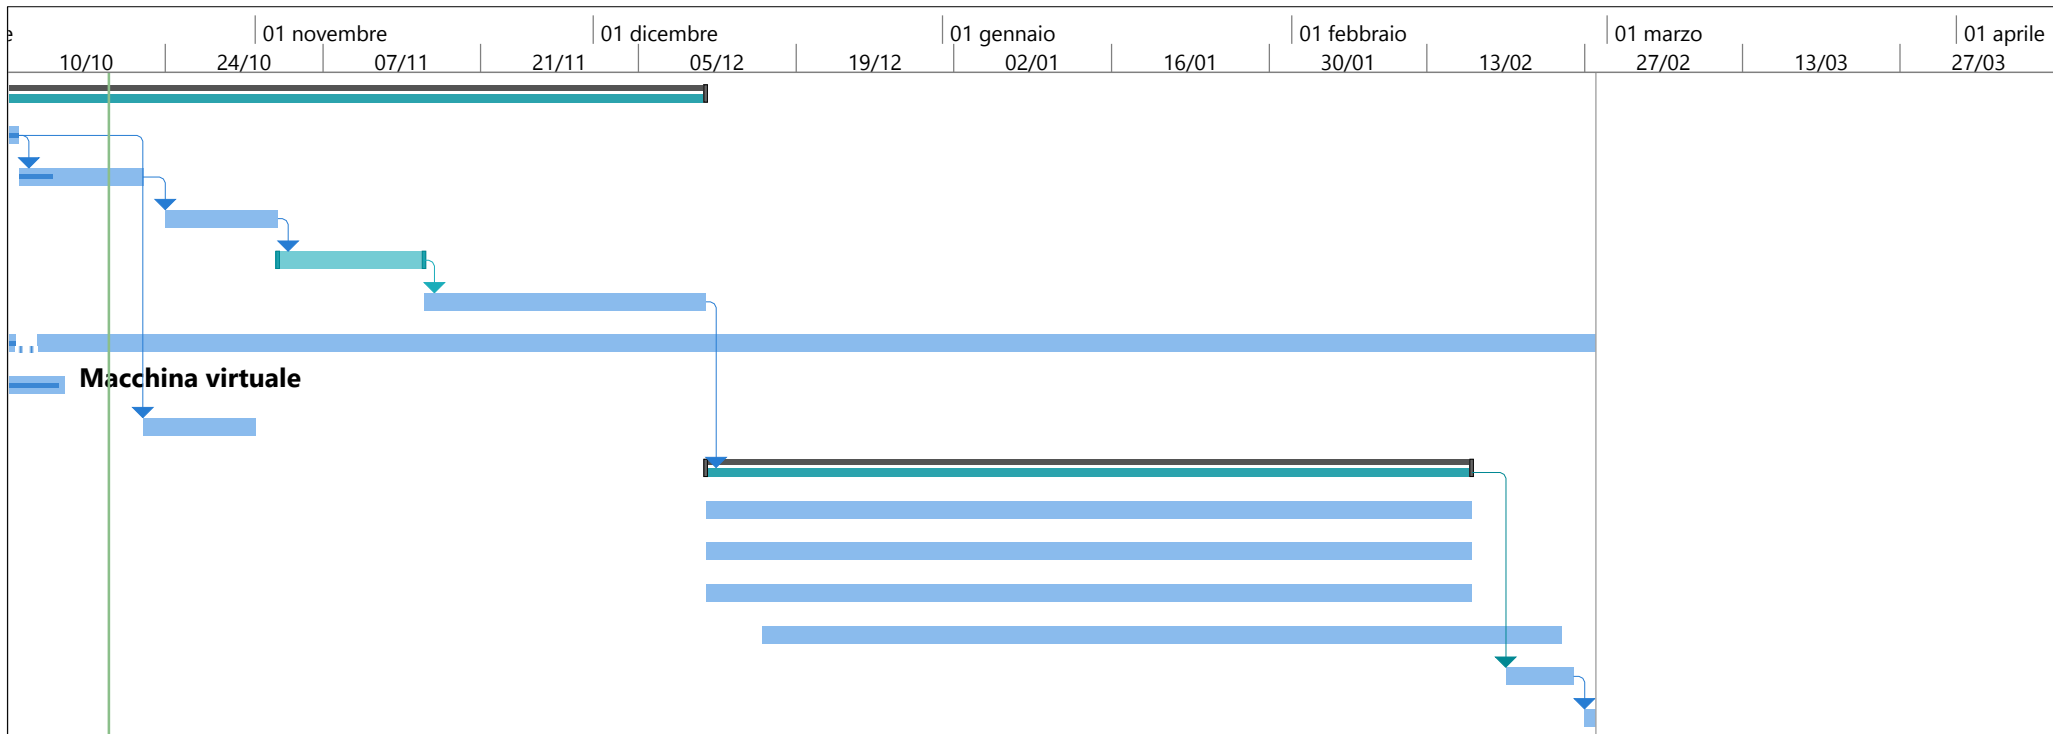

Progetto: PDP\_Gantt  
Data: mer 19/10/16

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			
